




## Aktivitäten des LV in Havixbeck

- 1. Betriebliche Belange
- 2. Überleitung Kläranlage Tilbeck
- 3. Relnvest Kläranlage Havixbeck
- 4. Beitragsentwicklung Sonderinteresse







#### Rückblick

- Übergangsjahr ohne besondere Vorkommnisse
- Überwachungswerte jederzeit eingehalten
- Arbeitssicherheit gewährleistet
- Turnusmäßige W + I abgearbeitet
- Keine betrieblichen Maßnahmen über das erforderliche Maß hinaus
- Vorbereitung auf das Umbauprojekt
- Betriebsbudget gemäß Planansatz



#### Rückblick

- Erneuerung Schlammabgabestation
- Sanierung Trübwasserleitung
- Erneuerung Bio-P-Pumpe
- Gehölzarbeiten











Einblick





- Umbau im laufenden Betrieb
   24/7
- Provisorien erfordern besondere Aufmerksamkeit
- Koordination zwischen
   Betrieb und Projekt (Baustelle)
   und Abstimmung der
   Maßnahmen



Einblick

• Sicherstellung Roh-, Betriebs- und Hilfsstoffe

Fällmittel, Strom, Öl, ...

- Schlammtransporte
- Ausstattung

Maschinen, Material, Fahrzeuge, ...





#### Ausblick

- Entwicklung der gesellschaftlichen Gesamtlage Corona, Ukraine-Konflikt, ...
- Betrieb im Rahmen des Umbauprojektes
- Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis (derzeit befristet bis 31.12.2022)
- Entwicklung am Schwerpunkt

Bezirksregierung Münster



10.10.2012 Seite 1 von 3

Aktenzeichen:

500-8657770/0001

Gegen Empfangsbekenntnis

Lippeverband
Kronprinzenstraße 24

45128 Essen

Auskunft erteilt: Bernhard Wielens

Nr. 1153

Durchwahl: 411-1581 Telefax: 411-8158 Raum: R 128 E-Mail: dez54 @brms.nrw.de

Dienstgebäude un

Nevinghoff 22 48143 Münster Telefon: 0251 411-Telefax: 0251 411-Poststelle@brms.r www.brms.nrw.de

OPNV - Haltestelle Domplatz: Linien 1 12, 13, 14, 22 Bezirksregierung II (Albrecht-Thaer-St Linie 17

Bürgertelefon: 0251 411 – 4444 Schultelefon: 0251 411 - 4113 Grünes Umweltsch 0251 411 – 3300

Erlaubnis gemäß §§ 8 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Kläranlage Havixbeck

Wasserrechtliche Erlaubnis vom 27.02.2008, AZ: 54.3-2.21-3.5-17/08, Nr.: 1153

Ihr Antrag auf Verlängerung der Erlaubnis vom 27.08.2012, Az.:12-VI-30

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrem Antrag ergeht zu meiner Erlaubnis vom 27.02.2008, AZ: 54.3-2.21-3.5-17/08, Nr. 1153, zur Einleitung von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Havixbeck in den Hemkerbach folgender

#### 1. Änderungsbescheid:

 Der Text unter Ziffer 3 meines Erlaubnisbescheides vom 27.08.2008 wird wie folgt neu gefasst:

Die Erlaubnis ist gültig bis zum 31.12.2022.



# Überleitung Kläranlage Havixbeck-Tilbeck

#### Überleitung KLA Havixbeck-Tilbeck

- Realisierung des ersten Abschnittes entlang der K50 im Zuge des Ausbaus der K50 durch Kreis COE Synergieeffekte durch Bündelung dieser Maßnahmen
- Nördlicher Trassenabschnitt derzeit bei der Bezirksregierung MS zur Genehmigung.
- Ausschreibung und anschließende Bauausführung erfolgen zeitnah



#### Überleitung KLA Havixbeck-Tilbeck

Zeitplan

Entwurfsplanung

Genehmigungsphase

Ausführungsplanung(en)

Vergabe(en)

Bauzeit

Inbetriebnahme (Gesamt)

1 / 2022

III / 2022

(Anzeige § 57.1 LWG)

bis III / 2022

IV / 2022 - I 2023

I / 2023 – IV / 2023

IV / 2023



# Relnvest Kläranlage Havixbeck



## ReInvest KLA Havixbeck Status

- Alle Gewerke erfolgreich in Bauausführung (Ausnahme BHKW / Klärgas)
- Überprüfung und Optimierung der Ausschreibungsunterlagen inkl. Umbaukonzept für das BHKW mit seinen Nebenanlagen hinsichtlich der Emissionen (Methan)
- Inbetriebnahme und störungsfreier Betrieb eines Provisoriums für Rechenanlage und Sandfang für abwasserfreies Arbeiten
- Inzwischen vollständiger Rückbau des Sandfangs Abschluss der Kampfmitteluntersuchungen Beginn des Neubaus





#### Relnvest KLA Havixbeck

#### Kostenentwicklung

#### Vergaben III 2022

<ul> <li>Baukosten</li> </ul>
-------------------------------

- Bautechnik (verg.)
- M-Technik (verg.)
- E-Technik (verg.)
- BHKW und Klärgas (nn)
- Baunebenkosten

ca. 4,0 Mio. €

ca. 1,0 Mio. €

ca. 1,5 Mio. €

ca. 0,7 Mio. €

ca. 0,8 Mio. €

ca. 1,0 Mio. €





#### Relnvest KLA Havixbeck

#### Zeitplan

Abschluss der Vorplanung I / 2020

Entwurfsplanung IV / 2020

Genehmigungsphase II / 2021 (nur Baugenehmigung)

Ausführungsplanung(en) bis II / 2021

Vergabe(en) III / 2021 – IV / 2022

Bauzeit III / 2021 bis IV / 2024



#### Relnvest KLA Havixbeck

#### Positiver Zwischenstand / Risiken durch Pandemie und Krieg

#### Kosten

- Vorteilhafte Vergabe der Maschinentechnik noch in 2021 (vor dem Krieg / Störung der Lieferketten)
- Preiserhöhungen werden durch den LV nur nach detaillierter Vorlage entsprechender Nachweise und nur für Materialkosten akzeptiert.
- Kostensteigerungen können nicht ausgeschlossen werden.

#### **Termine**

- Gestörte Lieferketten in nahezu allen Gewerken
- Bestehendes Risiko von Verzögerungen
- Prüfung von möglichen Beschleunigungsmaßnahmen (insbesondere erforderliche Bauteile für E-Technik)






## Beitragsentwicklung für das Sonderinteresse



#### **KLA Havixbeck**

Kosten- und Beitragsentwicklung (ab 2022 Schätzungen)


Vorschlag zu Beiträgen von 9/2021
Vor dem Hintergrund der aktuellen Kostenentwicklung

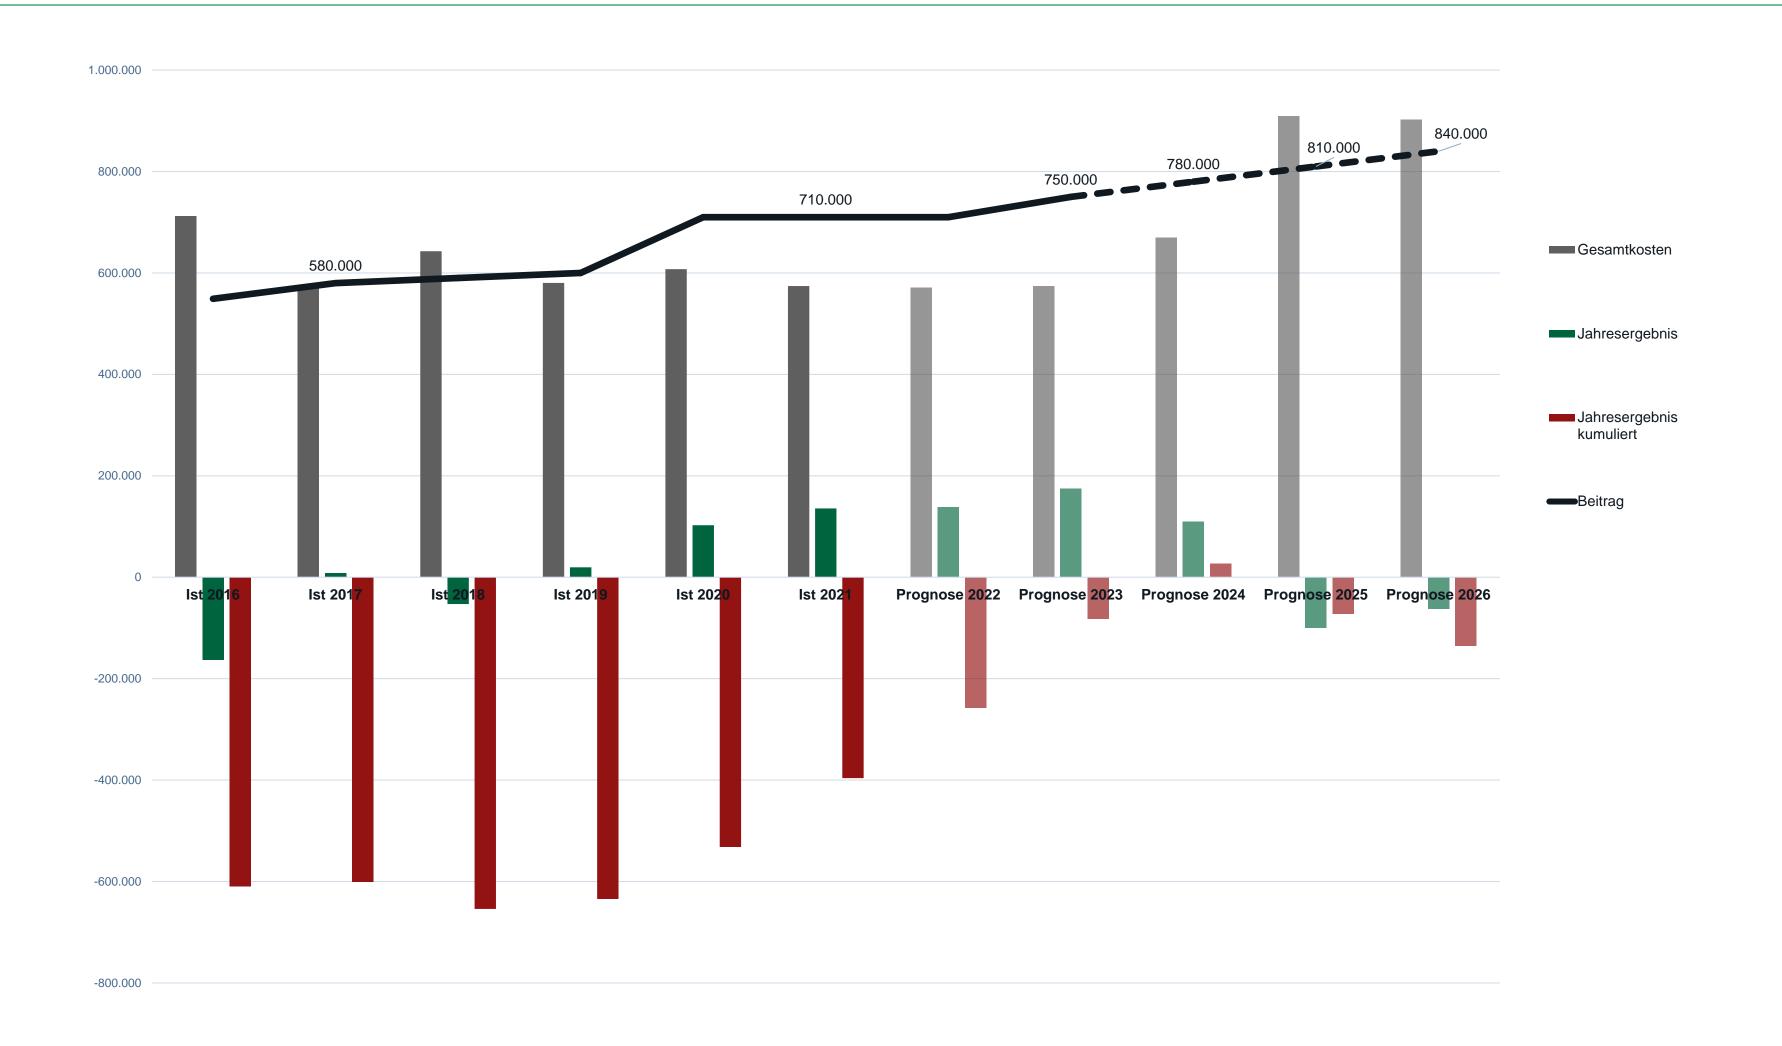



#### **KLA Havixbeck**

#### Kosten- und Beitragsentwicklung (ab 2022 Schätzungen)

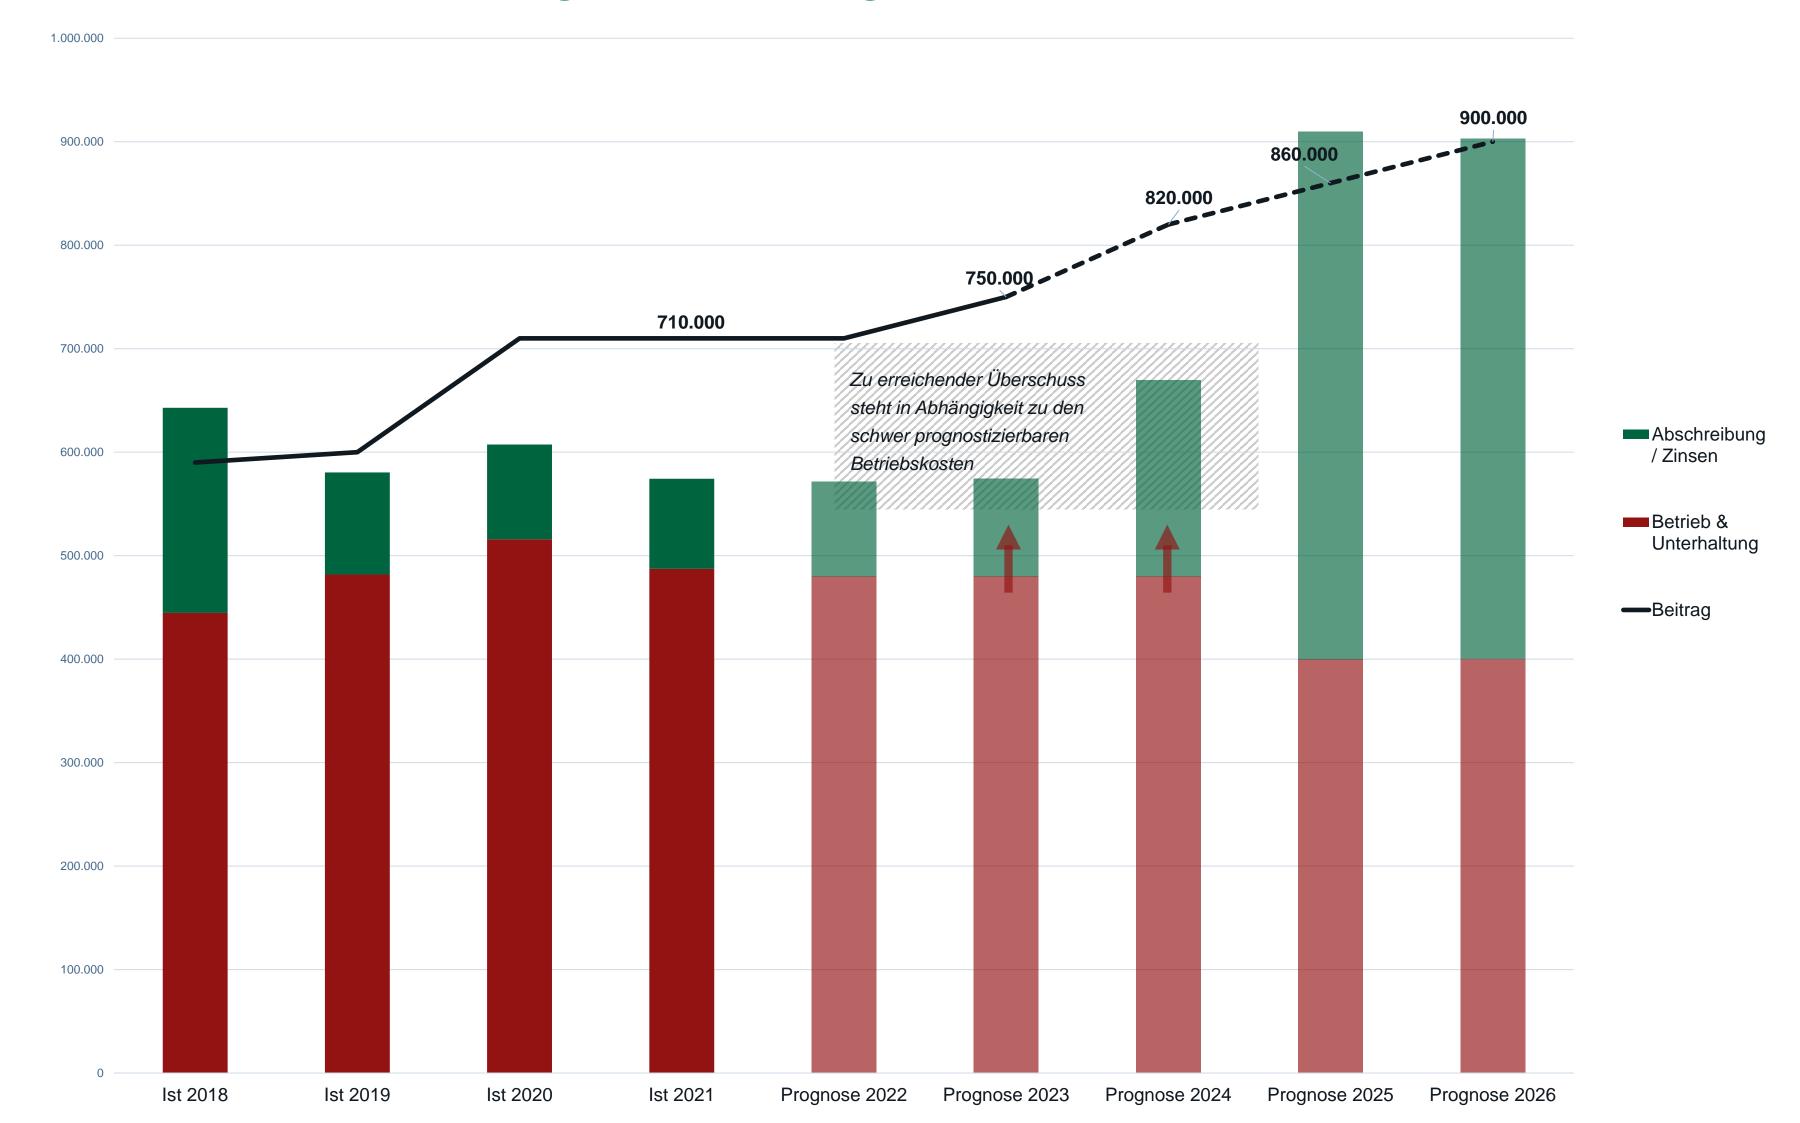

Stand: Juli 2022



#### **KLA Havixbeck**

#### Kosten- und Beitragsentwicklung (ab 2022 Schätzungen)

#### Vorschlag

Rahmenbedingungen:
 negative Beitragsausgleichsrücklage
 steigende Energiekosten / allg. Preissteigerungen
 seriöse Prognose der Betriebskosten unmöglich

• Deutliche Erhöhung der Beiträge für 2024 und 2025

2023: 750.000,-€ 2024: 820.000,-€ 2025: 860.000,-€

 Ziel: Negative Beitragsausgleichsrücklage bis 2026 abbauen, Abbau zumindest beschleunigen

Ab 2025: Pauschale überprüfen und anpassen

